

Mätprotokoll


ORT Robertsfors	SIGNATUR LA	DATUM 2022-06-08	PROJEKTNUMMER 1087
--------------------	----------------	---------------------	-----------------------

Beställare:
Norconsult
Tomas Berglund

Objekt:
Jenningsskolan. Riktad miljöinventering

Mätplats & Mätpunkt Material - Ytskikt		MP 1 (18) Betongplatta - massagolv			Mätplats & Mätpunkt Material - Ytskikt		MP 2 (19) Betongplatta - massagolv		
Datum	Djup(mm)	T(°C)	RF(%)	FK(%)	Datum	Djup(mm)	T(°C)	RF(%)	FK(%)
2022-06-08	104(igenom)	21,6	93,7		2022-06-08	95(igenom)	21,9	86,6	
2022-06-08	45	22,1	88,4		2022-06-08	46	22,6	79,6	

Mätplats & Mätpunkt Material - Ytskikt		MP 3 (20) Betongplatta - massagolv			Mätplats & Mätpunkt Material - Ytskikt		MP 4 (21) Betongplatta - massagolv		
Datum	Djup(mm)	T(°C)	RF(%)	FK(%)	Datum	Djup(mm)	T(°C)	RF(%)	FK(%)
2022-06-08	350(igenom)	20,4	89,1		2022-06-08	300(igenom)	20,2	92	
2022-06-08	125	21,6	92,6						
2022-06-08	50	20,9	90,3						

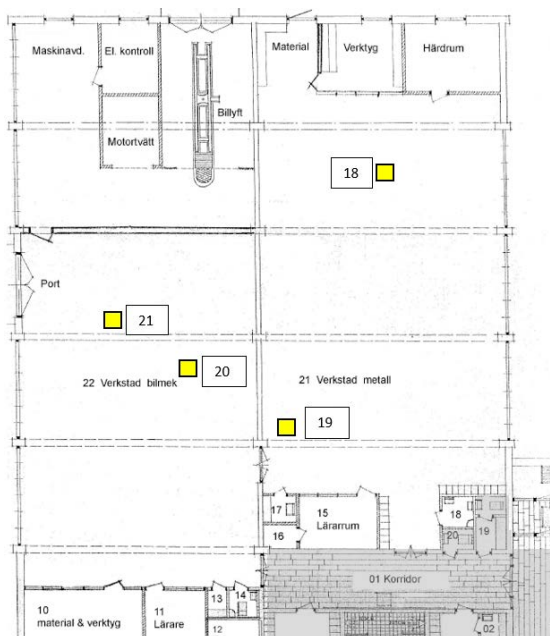

Rådgivande fuktmätning med Protimeter Hygrom RF-mätare med kalibrerade givare 2021-07-xx.

Mätningar ej utförda enligt RBK's system.

Mätproberna har varit monterade i 30 minuter.

Djupet för mätpunkterna är borrar i yta på ca:20% av den totala tjockleken samt igenom plattan och i mitten. Sedan pluggat >72 timmar.

Mätosäkerhet påslagen 3%.
