


 GAVLEGÅRDARNA	Dokument 06-1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER	Sid nr 0 (37)
		Datum 2015-09-11 Rev: 2024-11-01
		Projekt nr 4002-240312
Status Förfrågningshandling	Projektnamn Sätra 58:4, Pinnmovägen 2 & 4 Ombyggnad 2025	Projektledare Emil Ivarsson
		Dokumentversion 0.27

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Förfrågningshandling

TOTALENTREPRENAD

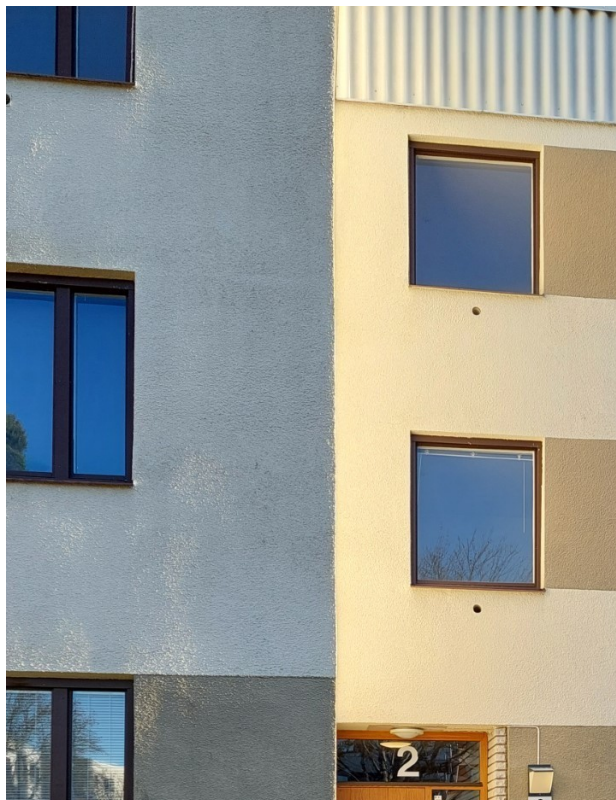

AB GAVLEGÅRDARNA Fastighetsutveckling

Innehåll

AF	ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER.....	5
AFA	ALLMÄN ORIENTERING	5
AFA.12	Beställare	5
AFA.121	Beställarens kontaktperson under anbudstiden	5
AFA.1211	Beställarens ombud	5
AFA.122	Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet	5
AFA.13	Projektörer	5
AFA.15	Nätägare.....	6
AFA.151	Nätägare - VA	6
AFA.152	Nätägare - värme	6
AFA.155	Nätägare - el.....	6
AFA.156	Kommunikationsnät	6
AFA.157	Nätägare - kabel-TV.....	6
AFA.158	Nätägare - datanät	6
AFA.2	Orientering om objektet	6
AFA.21	Översiktlig information om objektet.....	6
AFA.22	Objektets läge	7
AFA.4	Begreppsförklaringar	7
AFB	UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER.....	7
AFB.1	Former m.m. för upphandling.....	7
AFB.11	Upphandlingsform	7
AFB.12	Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling	7
AFB.13	Entreprenadform	7
AFB.14	Ersättningsform.....	7
AFB.17	Förutsättningar för upphandlingens genomförande	7
AFB.2	Förfrågningsunderlag.....	7
AFB.21	Tillhandahållande av förfrågningsunderlag	7
AFB.22	Förteckning över förfrågningsunderlag.....	8
AFB.23	Kompletterande förfrågningsunderlag	9
AFB.25	Frågor under anbudstiden.....	9
AFB.3	Anbudsgivning.....	9
AFB.31	Anbuds form och innehåll.....	9
AFB.32	Anbudstidens utgång.....	9
AFB.33	Anbudets giltighetstid	9
AFB.34	Adressering	10
AFB.4	Anbudsöppning.....	10
AFB.5	Prövning av anbudsgivare och anbud	10
AFB.51	Uteslutande av anbudsgivare	10
AFB.52	Prövning av anbudsgivare lämplighet.....	11
AFB.53	Prövning av anbud	13
AFB.54	Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud	15
AFD	ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TALENTREPRENAD.....	15
AFD.1	Omfattning	15
AFD.11	Kontraktshandlingar.....	15
AFD.111	Sammanställning över ändringar i ABT 06.....	15
AFD.12	Arbetsområde	16
AFD.121	Arbetsområdets gränser.....	16
AFD.122	Syn före påbörjande av arbete.....	16
AFD.13	Förutsättningar	16
AFD.131	Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten	16
AFD.132	Arbetstider.....	17
AFD.133	Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet.....	17
AFD.1331	Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare.....	17
AFD.134	Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader.....	17
AFD.14	Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m.....	17
AFD.15	Varor m m.....	17
AFD.151	Varor från entreprenören.....	17
AFD.152	Varor eller arbeten från beställaren	18
AFD.157	Utbildning och support.....	18
AFD.16	Tillstånd m.m.	18
AFD.161	Tillstånd från myndigheter.....	18

AFD.162	Myndighetsbesiktning	18
AFD.17	Anmälningar	18
AFD.171	Anmälningar till myndigheter	18
AFD.18	Författningar	18
AFD. 181	Tillsyn och kontroll enligt PBL.....	18
AFD.1811	Kontrollplan enligt PBL	18
AFD.183	Ansvar för byggarbetsmiljö.....	18
AFD.1831	Arbetsmiljöplan.....	18
AFD.1832	Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P).....	19
AFD.1833	Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)	19
AFD.1834	Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare.....	19
AFD.185	CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar.....	20
AFD.1851	CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning	20
AFD.2	Utförande	20
AFD.21	Kvalitetsangivelser.....	20
AFD.22	Kvalitets- och miljöarbete.....	20
AFD.221	Kvalitetsledning	20
AFD.222	Miljöledning.....	21
	Anbudsgivare skall överföra kraven på miljöstyrning till projektörer, underentreprenörer och leverantörer, lämnas efter anmodan till beställaren.....	21
AFD.223	Beställarens kvalitets- och miljöplan	21
AFD.224	Entreprenörens kvalitetsplan och miljöplan	21
AFD.23	Ändringar och tilläggsarbeten	21
AFD.241	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden	21
AFD.242	Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden	21
AFD.2423	Nyttjande av handlingar m.m.	23
AFD.25	Beställarens krav på sekretess.....	23
AFD.26	Information	24
AFD.262	Beställarens informationsverksamhet.....	24
AFD.263	Information till fastighetsägare, boende m fl.	24
AFD.27	Underrättelse om avvikelser o d.....	24
AFD.28	Entreprenörens kontroll	24
AFD.3	Organisation	24
AFD.31	Beställarens organisation	24
AFD.311	Beställarens ombud	24
AFD.312	Beställarens projektledare m fl.....	25
AFD.313	Beställarens kontrollant.....	25
AFD.314	Beställarens kvalitetsansvarige	25
AFD.315	Beställarens miljöansvarige.....	25
AFD.316	Beställarens informationsansvarige.....	25
AFD.318	Beställarens övriga befattningshavare.....	25
AFD.32	Entreprenörens organisation	25
AFD.321	Entreprenörens ombud	25
AFD.322	Entreprenörens projekteringsledare.....	25
AFD.323	Entreprenörens arbetschef, platschef m fl.	25
AFD.324	Entreprenörens kvalitetsansvarige.....	25
AFD.325	Entreprenörens miljöansvarige.....	25
AFD.33	Möten.....	25
AFD.331	Startmöte	25
AFD.332	Projekteringsmöten	25
AFD.333	Byggmöten.....	26
AFD.34	Projekteringsledning, arbetsledning och anställda	26
AFD.343	Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06 26	
AFD.345	Elektronisk personalliggare.....	26
AFD.35	Underentreprenörer	27
AFD.36	Beställarens kontroll	27
AFD.37	Samordning.....	28
AFD.371	Samordning av arbeten.....	28
AFD.38	Dagbok.....	28

AFD.39	Uppmätning	28
AFD.4	Tider.....	28
AFD.41	Tidplan.....	28
AFD.42	Igångsättningstid.....	28
AFD.45	Färdigställandetider	28
AFD.46	Förändring av kontraktstid	28
AFD.47	Garantitid	28
AFD.471	Garantitid för entreprenaden	28
AFD.472	Särskild varugaranti	28
AFD.5	Ansvar och avhjälpande.....	29
AFD.51	Vite	29
AFD.511	Vite vid försening.....	29
AFD.518	Övriga viten.....	29
AFD.53	Ansvar mot tredje man	29
AFD.531	Syn inom närliggande område.....	29
AFD.54	Försäkringar.....	29
AFD.55	Ansvar för brandskydd.....	30
AFD.5512	Entreprenörens tillståndsansvarige.....	30
AFD.57	Avhjälpande.....	30
AFD.58	Ansvar efter garantitiden.....	30
AFD.6	Ekonomi.....	30
AFD.61	Ersättning.....	30
AFD.611	Ersättning för ändringar och tillägsarbeten	30
AFD.614	Ersättning för kostnadsändring (indexreglering).....	31
AFD.615	Slutavräkning	31
AFD.62	Betalning.....	31
AFD.622	Betalningsplan.....	31
AFD.623	Förskott	31
AFD.624	Faktureringsplan.....	31
AFD.625	Dröjsmålsränta	32
AFD.63	Säkerhet	32
AFD.631	Säkerhet till beställaren.....	32
AFD.7	Besiktning	32
AFD.71	Entreprenadbesiktningar	32
AFD.713	Slutbesiktning.....	32
AFD.714	Garantibesiktning	33
AFD.716	Efterbesiktning	33
AFD.718	Besiktningsman.....	33
AFD.72	Besiktningssammanträde	33
AFD.8	Hävande	33
AFD.9	Tvist	33
AFG	ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL	33
AFG.11	Placering av allmänna hjälpmedel	34
AFG.111	Placeringsritning som upprättas av entreprenören.....	34
AFG.12	Bodar.....	34
AFG.13	Tillfällig väg och plan.....	34
AFG.14	Tillfällig el- och va försörjning	34
AFG.3	Skydd mm	34
AFG.31	Skydd av arbete och egendom mm	34
AFG.311	Skydd av arbete	34
AFG.312	Skydd av ledning, mätpunkt m	34
AFG.315	Skydd av egendom	34
AFG.316	Tillfällig inhägnad	35
AFG.32	Arbetsarskyddsanordningar	35
AFG.34	Bullerskydd.....	35
AFG.36	Begränsning av miljöförstörande utsläpp.....	35
AFG.5	Arbetsställningar och montering	35
AFG.51	Arbetsställningar	35
AFG.6	Ursparning, håltagning, igensättning och tätning.....	35
AFG.61	Ursparning och håltagning	35
AFG.7	Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten mm	36
AFG.71	Uppvärmning och uttorkning	36



AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m.....	36
AFG.82 Renhållning.....	36
AFG.83 Städning och slutrengöring	36
AFG.831 Städning.....	36
AFG.832 Slutrengöring	36
AFG.85 Återställande av mark	36

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

Dessa Administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21.

För entreprenader gäller allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, ABT 06.

De avsteg som gjorts från ABT 06 finns införda i dessa administrativa föreskrifter under AFD.111.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.12 Beställare
AB GAVLEGÅRDARNA
Box 456
801 06 Gävle
Tel 026-17 27 00

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden
Emil Ivarsson
Tel 026-17 27 32
E-post : emil.ivarsson@gavlegardarna.se

AFA.1211 Beställarens ombud
Mattias Janson
Tel 026-17 27 73
E-post: mattias.janson@gavlegardarna.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet
Frågor om entreprenaden under anbudstiden besvaras av:
Emil Ivarsson
Tel 026-17 27 32
E-post: emil.ivarsson@gavlegardarna.se

AFA.13 Projektörer

Arkitekt och ramhandlingar Bygg
CW Byggkonsult AB
Ingela Wallér
Tel. 070-232 09 33
E-post: cwbygg@telia.se

Brand
Briab AB
Andreas Johansson
Tel. 070 791 00 20
E-post: andreas.johansson@briab.se

Ramhandlingar Rör & Vent
AB Gavlegårdarna



Erik Pettersson
Tel. 026-17 28 36
E-post: erik.pettersson@gavlegardarna.se

Ramhandlingar EL
Projektel
Nicklas Elffors
Tel. 070-2861318
E-post: nicklas@projektel.com

AFA.15 Nätägare

AFA.151 Nätägare - VA
Gästrike Vatten AB Tel 026-17 85 00

AFA.152 Nätägare - värme
Gävle Energi AB Tel 026-17 85 00

AFA.155 Nätägare - el
Gävle Energi AB Tel 026-17 85 00

AFA.156 Kommunikationsnät
AB Gavlegårdarna, Tel 026-17 27 00

AFA.157 Nätägare - kabel-TV
AB Gavlegårdarna, Tel 026-17 27 00

AFA.158 Nätägare - datanät
AB Gavlegårdarna, Tel 026-17 27 00

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Huset består av källarplan, bottenplan och 2 våningsplan (vån.plan 1 och vån.plan 2). Ingångarna 2 och 4 är sammanbundna med en passage på varje våningsplan och en gemensam hiss i trapphus 2.

Projektet omfattar invändig ombyggnad och med ny lägenhetsfördelning. Trapphusen består innan ombyggnationen av 35st studentlägenheter som efter ombyggnad ska bli 21st lite större lägenheter.

Alla lägenheter på Pinnmovägen 2 och 4 byggs om för separat elmätning vilket de inte har i nuläget. Pinnmovägen 6 – 14 utföres förberedande elarbete med mätarblock i källare.

Lägenheter på vån 1 och 2 kommer ingå i ett serviceboende i omvårdnad

Alla lägenheter renoveras i samma enhetliga standard och får nya ytskikt i form av golv, målade väggar och tak.

Alla lägenheter får nya kök som anpassas efter nya planlösningen och uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Ytskikten i badrummen

behålls i alla lägenheter utom den som nyttjas som samlingssal där en ny RWC byggs.

AFA.22 Objektets läge

Objekten är belägna i stadsdelen Sättra, Sättra 58:5, Gävle kommun med adress Pinnmovägen 2 & 4.

AFA.4 Begreppsförklaringar

Använda begrepp följer ABT 06 och AMA AF 21.

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

Lag om offentlig upphandling tillämpas för upphandlingen, LOU, SFS 2016:1145

AFB.1 Former m.m. för upphandling

AFB.11 Upphandlingsform

Upphandlingsform generalentreprenad

AFB.12 Upphandlingsförfarande vid offentlig upphandling

Upphandling sker genom förenklat förfarande.

AFB.13 Entreprenadform

Totalentreprenad

AFB.14 Ersättningsform

Fast pris utan indexreglering

AFB.17 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

Beställaren förbehåller sig rätten att avbryta upphandlingen om kostnadsnivån blir för hög i förhållande till budgeterade medel, om bygglovets inte beviljas, alla hyresgäster inte godkänner ombyggnationen eller pga. andra sakliga skäl. Beställaren är ej skyldig att betala ersättning till anbudsgivare, av vilket slag det än må vara, pga. utebliven upphandling av entreprenadarbetena.

Om inga lämpliga anbud inkommit har beställaren rätt att övergå till förhandlat förfarande utan föregående annonsering.

AFB.2 Förfrågningsunderlag

AFB.21 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Distribution av anbudshandlingar sker elektroniskt via KommersAnnons. Hemsida <https://www.kommersannons.se>

Handlingar finns tillgängliga via den länk som framgår av upphandlingsannonsen.

All informationshantering under upphandlingsprocessen sker elektroniskt genom KommersAnnons. Det är av stor vikt att



anbudsgivare har kontinuerlig bevakning av e-postadressen som angetts till KommersAnnons. Till denna E-postadress kommer det att skickas aviseringar om nya uppgifter om upphandlingen.

AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar

02 Ändringar i ABT 06 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifterna.

03 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenad avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. ABT 06 (bifogas ej).

06 Förfrågningsunderlag

06-1 Dessa administrativa föreskrifter för entreprenaden daterad 2025-02-12

AF gäller före handlingar i pkt 06-2 o 3.

06-2 Beskrivningar

06-2.1 Rambeskrivning Bygg daterad 2025-02-12

06-2.2 Rambeskrivning VVS & Vent daterad 2025-02-11

06-2.3 Rambeskrivning El med Bilagor daterad 2025-02-11

06-2.4 Brandskyddsbeskrivning daterad 2025-02-10

06-3 Ritningar:

06-3.1 Ritningar enligt ritningsförteckning A-ritningar dat 2025-01-28

07 Övriga handlingar

07-1 Anbudsformulär

07-2 Förfrågningsmall för referensobjekt

07-3 Förfrågningsmall för platschef/ produktionschef

07-4 Entreprenörshandboken

07-5 AB Gavlegårdarnas Miljöpolicy

07-6 AB Gavlegårdarnas Kvalitetspolicy

07-7 Arbetsmiljöplan dat 2025-02-12

07-8 Instruktion Projekteringsanvisning Datanätsystem

07-9 Instruktion Projekteringsanvisning

Passagekontrollsystem

07-10 Särskilda ersättnings- och mättningsbestämmelser

MER Anläggning 20 och Mer Hus 21 (bifogas inte)

07-11 Äldre ritningar VVS, Vent

07-12 Äldre ritningar El.

Äldre ritningar enligt ritningsförteckning. Är endast att ses som informationsmaterial som måste undersökas på plats gällande utförande och skala mm.

Anbudsgivare är skyldig att själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt förteckningen erhållits.

Ej bifogade handlingar finns för påseende på Beställarens huvudkontor.

AFB.23 Kompletterande förfrågningsunderlag

Kompletteringar av förfrågningsunderlaget under anbudstiden kan ske via beställaren senast 5 arbetsdagar före anbudstidens utgång.

Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor eller av någon annan anledning, kommer detta att publiceras i KommersAnnons under respektive ärende. Intressenter och presumtiva anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publiceringen av kompletteringar under anbudstiden.

AFB.25 Frågor under anbudstiden

Vid eventuella frågor om upphandlingen skickar anbudsgivaren sin frågeställning genom frågor- och svarsfunktionen i KommersAnnons.

För att beställaren ska hinna arbeta fram relevant svar skall frågor ställas senast 5 arbetsdagar före anbudstidens utgång. Beställaren lämnar svar inom 3 arbetsdagar.

Intressenter och presumtiva anbudsgivare ansvarar själva för att bevaka publicering av frågor och svar.

AFB.3 Anbudsgivning

AFB.31 Anbuds form och innehåll

Anbud lämnas som E-anbud via KommersAnnons.

Anbud bör vara uppställt enligt tillhandahållet formulär och följa förfrågningsunderlaget. Anbudet skall vara angivet på det svenska språket och prissatt i SEK.

Beställaren använder sig av elektronisk anbudsmottagning. Ska elektroniskt anbud (e-anbud) lämnas för första gången, se till att registrering sker i god tid innan sista anbudsdag.

Anbud via e-postmeddelande räknas inte som elektroniskt anbud (e-anbud).

AFB.32 Anbudstidens utgång

Anbud skall vara beställaren tillhanda senast den 2025-03-05.

AFB.33 Anbudets giltighetstid

Anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud i 60 dagar efter anbudstidens utgång. Om upphandlingen blir föremål för en överprövningsprocess i domstol ska anbudsgivare vara bunden av sitt anbud även för tid därutöver till och med 14 dagar efter att processen avgjorts genom lagakraftvunnet avgörande, dock längst till och med 2025-09-05.

AFB.34 Adressering

Anbud skall lämnas elektroniskt via KommersAnnons.
Alla övriga sätt kommer att leda till att anbudet förkastas.

AFB.4 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas.
Anbudsöppningen sker snarast efter anbudstidens utgång.

AFB.5 Prövning av anbudsgivare och anbud

Prövning av anbudsgivare och anbud sker snarast efter anbudsöppningen.

Anbudet måste vara komplett enligt förfrågningsunderlaget. Anbud får inte innehålla några icke prissatta reservationer eller andra avvikelser från förfrågningsunderlagets ovillkorliga förutsättningar s.k. skall krav. Anbud som inte uppfyller dessa krav kan komma att förkastas.

Observera: Beställarens möjligheter att efter anbudstidens utgång tillåta förtydliganden/kompletteringar och ev. rättelser av anbud är ytterst begränsade.

AFB.51 Uteslutande av anbudsgivare

1. Beställaren kommer att utesluta anbudsgivare från deltagande i upphandlingen om denne eller företrädare för denne (om anbudsgivaren är en juridisk person) genom lagakraftvunnen dom är dömd för:

- sådan brottslighet som motsvarar deltagande i kriminell organisation
- bestickning
- bedrägeri riktat mot Europeiska Unionens finansiella intressen, eller
- penningtvätt
- terroristbrott
- människohandel

i enlighet med 13 kap. 1 § LOU (se aktuellt lagrum för fullständiga definitioner av uteslutningsgrunderna).

Vidare kan anbudsgivare komma att uteslutas enligt 13 kap. 2-3 § LOU om denne:

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande,
3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen,
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och Beställaren kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i Sverige eller det egna landet, eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 13 kap. LOU.

Anbudsgivare kan, om denne är en juridisk person, även komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen om en företrädare för denne dömts för brott som avses i punkten 3 eller om denne gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkten 4 ovan.

Anbudsgivare äger heller inte rätt att anlita underleverantörer som är föremål för omständigheter som redovisas i detta avsnitt.

AFB.52 Prövning av anbudsgivare lämplighet

För att ett rätt i tid inkommet anbud skall utvärderas enligt AFB.53 skall följande krav vara uppfyllda:

1. Anbudsgivaren måste vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregistret, under förutsättning att registreringsskyldighet föreligger.

Utländska anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokumentation på i hemlandet föreskrivna registreringar av anbudsgivarens bolag.

2. Entreprenören skall ha fullgjort sina åligganden avseende skatter och sociala avgifter i Sverige. Detta kan komma att kontrolleras genom uppgifter via Skatteverkets blankett SKV 4820.

Utländska anbudsgivare ska till sitt anbud bifoga dokumentation på att skatter och sociala avgifter eller motsvarande skyldigheter i hemlandet är uppfyllda.

3. Anbudsgivaren får inte ha uteslutits enligt AFB.51.
4. Anbudsgivaren skall uppfylla nedan redovisade krav på ekonomisk kapacitet:
Anbudsgivare får ej ha lägre riskklass än 3 enligt Upplysningscentralen företagsupplysning (UC) eller motsvarande nivå hos annat kreditupplysningsföretag. Beställare kontrollerar anbudsgivaren hos UC. Om anbudsgivare vet om att riskklassbedömningen är lägre eller om anbudsgivaren verksamhet är av sådan art att riskkvalriskbedömning inte kan erhållas ska anbudsgivaren inkomma med godkänd förklaring eller bevis på att man uppfyller riskklass 3 eller motsvarande nivå på annat kreditupplysningsföretag. Handlingar skall vara beställaren tillhanda senast tre dagar efter anmodan om bevis eller

förklaring. Anbudsgivare som bedöms vara i ej godtagbar riskklass/ha låg kreditvärdighet kan komma att uteslutas.

5. Anbudsgivare som har ett nystartat företag och/eller saknar uppsatt rating ska visa att företaget har en stabil ekonomisk bas genom att tillhandahålla en ekonomisk fullgörandegaranti (t ex bankgaranti eller koncerngaranti) eller utdrag ur årsredovisningen t.ex. balans- och resultaträkning. Begärd dokumentation ska vara den upphandlande myndigheten tillhanda inom fem (5) arbetsdagar. Anbudsgivaren ska ha ekonomisk kapacitet att fullgöra entreprenaden under hela avtalstiden.

Bevis om finansiell och ekonomisk ställning inhämtas genom att B inhämtar kreditupplysning från UC vid handläggningen av anbudsgivarens anbud. Uppgifterna ska visa att anbudsgivaren är kreditvärdig – lägst riskklass 3 på UC:s skala.

I de fall lägre riskklassificering redovisas alternativt att anbudsgivarens verksamhet är av sådan art att riskklassificering ej kan erhållas kommer anbudsgivaren ändå anses uppfylla dessa krav om någondera av nedan redovisade punkter uppfylls: Anbudsgivaren lämnar en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar motsvarande ekonomisk stabilitet.

Anbudsgivare ska dessutom årligen, under de senaste 3 åren (2021-2023) minst ha haft en genomsnittlig årsomsättning på 20 miljoner kr per år.

6. Anbudsgivaren skall ha ett kvalitetssystem och miljösystem (ISO 9001 och ISO 14001 eller likvärdigt), till anbudet skall intyg på ISO-certifiering bifogas. I de fall anbudsgivaren inte är ISO-certifierad skall anbudsgivarens kvalitets & miljösystem bifogas anbudet.
7. Anbudsgivaren skall ha minst två godkända referensobjekt. Referenser på objekten skall lämnas enligt bifogad *Förfrågningsmall för referensobjekt*, max tre min två referenser. Referensobjekt måste uppfylla alla nedanstående specificerade kriterier dvs. referensperson ska svara "JA" på alla frågor i *"Förfrågningsmall för referensobjekt"* för att referensobjekt ska anses vara godkänt. Om anbudsgivaren har haft uppdrag åt beställaren tidigare som uppfyller kraven för referensobjekt, skall denna/dessa användas i första hand. Beställaren förbehåller sig rätten att inhämta egna referenser. Uppringning, kontaktande av referenser kommer att göras endast för de företag som klarat samtliga skall-krav och har en anbudssumma som medför att dennes anbud, inklusive referensavdrag/ påslag, kan påverka utgången av upphandlingen.

Specificerade kriterier för godkännande av referensobjekt:

- a) Referensobjekt får ej vara ett pågående projekt eller ett

projekt äldre än 7 år.

b) Referensobjekt ska vara genomfört projekt avseende ombyggnation av lägenheter, lokaler eller vård- och omsorgsboende.

c) Entreprenaden skall ha varit totalentreprenad.

d) Entreprenören skall även bli rekommenderad till AB Gavlegårdarna.

8. För att anbudsgivarens anbud skall anses vara godkänt för utvärdering skall anbudsgivaren ha minst två godkända referensobjekt på platschef. Referenser på platschefen skall lämnas enligt bifogad *Förfrågningsmall för platschef/ produktionschef*, max tre min två referenser. Referensobjekt för platschef måste uppfylla alla specificerade kriterier under ovanstående punkt, se 7a-7d dvs. referensperson ska svara "JA" på alla frågor i *"Förfrågningsmall för platschef/ produktionschef,"* för att referensobjekt ska anses varar godkänt. Dock gäller för platschef/ produktionschef att referensobjekt ej får vara ett pågående projekt eller projekt äldre än 7 år.

Kontaktande av referenser kommer att göras endast för de företag som klarat samtliga skall-krav och har en anbudssumma som medför att dennes anbud, inklusive referensavdrag/ påslag, kan påverka utgången av upphandlingen.

Av AFD.34 framgår att utbyte av den enligt punkt 7 kvalificerade platschef/produktionschef i vissa fall kräver att en särskild redovisning av hur kvaliteten säkerställs har skett i anbudet.

AFB.53 Prövning av anbud

Anbud värderas enligt principen det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Under förutsättning att krav ställda under AFB.52 uppfylls kommer utvärdering att ske utifrån anbudsgivarens anbudssumma med prisreducering, alternativt prispåslag, för referenser för platschef (procentsatser enligt nedan) samt tillägg för regleringsmängd enligt följande kriterier:

Utvärderingskriterier		
Referenser platschef	1,0 - 1,99 i medelpoäng	10 % prispåslag på lämnad anbudssumma
	2,0 – 4,0 i	2,0 – 4,0 % i

	medelpoäng	prisreducering på lämnad anbudssumma
Regleringsmängden	Totala regleringsmängden kommer att läggas på anbudssumma	

Vid referenstagning kommer beställaren under tre arbetsdagar i rimlig omfattning söka angivna referenspersoner enligt de kontaktuppgifter som lämnats av anbudsgivaren. Nås inte kontakt med referenspersonen inom denna tid, kommer beställaren att ge anbudsgivaren möjlighet att tillse att referenspersonen kontaktar beställaren inom ytterligare två arbetsdagar. Nås ändå inte kontakt mellan beställaren och referenspersonen kommer referensen inte att beaktas vid utvärderingen.

Anbudsgivaren får endast i undantagsfall ange beställarens projektledare Emil Ivarsson för detta projekt som referens.

Referenser platschef / Produktionschef

För att bedöma referenser på platschef/ Produktionschef kommer bilaga "Förfrågningsmall för platschef/ Produktionschef" att användas. Platschef/ Produktionschef bedöms enligt frågor i bifogad förfrågningsmall för platschef/ Produktionschef.

Medelpoängen kommer att baseras på snittet av samtliga lämnade referenser. För medelpoäng:

- 1,0-1,99 ges ett påslag på anbudssumman med 10%.
- 2,0-4,0 ges en prisreducering på anbudssumman med 2,0-4,0%, dvs. med motsvarande procent.

Regleringsmängd

Regleringsmängd vid anbudsutvärdering, ej beställningsgrundande i entreprenaden. I anbudsutvärderingen kommer hela beloppen enligt nedanstående att läggas till anbudssumman:

- Material 200 000 kr x påslag (materialpåslag hämtat från anbudsförmulär)
- Entreprenörsarvode för UE 200 000 x påslag (UE påslag hämtat från anbudsförmuläret)
- Bygg-arbetare 200 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsförmuläret)
- Målare 100 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsförmuläret)
- El-arbetare 200 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsförmuläret)
- V-arbetare 100 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsförmuläret)
- VS-arbetare 100 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsförmuläret)



- Golvläggare 100 timmar x timkostnad (timkostnad hämtat från anbudsformuläret)

Uträkning i utvärderingsmodell:

(Anbudssumma) *minus/plus* (prisreducering alt prispåslag referenser platschef/produktionschef) *plus* (Regleringsmängd)
= Summa efter utvärdering

Exempel på uträkning i utvärderingsmall

Anbudssumma	1000 kr
Referenser platschef/produktionschef 3,75 i medelpoäng (3,75%*1000 kr)	-37,50 kr
Regleringsmängdens inverkan	<u>+10 kr</u>
Summa efter utvärdering	972,50 kr

Den som får lägst belopp i sammanställningen kommer att tilldelas uppdraget.

AFB.54 Meddelande om beslut vid prövning av anbudsgivare och anbud

Beställaren kommer snarast möjligt genom s.k. tilldelningsbesked att underrätta samtliga anbudsgivare om utgången av anbudsutvärderingen. Tilldelningsbeskedet meddelas elektroniskt till den angivna E-postadress som angetts till KommersAnnons. Tilldelningsbeskedet utgör inte ett civilrättsligt bindande avtal.

AFD ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID TOTALENTPRENAD

AFD.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar allt arbete och alla tjänster i den mån annat inte uttryckligen framgår av förfrågningsunderlaget, se förfrågningsunderlaget och kompletteringar, till en fullt färdig och fungerande produkt.

AFD.11 Kontraktshandlingar

Kontraktshandlingar kommer att upprättas.

AFD.111 Sammanställning över ändringar i ABT 06

AFD.13	Förutsättningar
AFD.161	Tillstånd från myndigheter
AFD.23	Ändringar och tilläggsarbeten
AFD.2423	Nyttjande av handlingar m.m.
AFD.371	Samordning av arbeten

AFD.46	Förändring av kontraktstid
AFD.471	Garanttid för entreprenaden
AFD.5	Ansvar och avhjälpande
AFD.57	Avhjälpande
AFD.611	Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten
AFD.713	Slutbesiktning
AFD.8	Hävande
AFD.9	Twist

AFD. 12 Arbetsområde

AFD.121 Arbetsområdets gränser

Som arbetsområde gäller erforderliga ytor som berörs av entreprenadarbeten, se entreprenadgränser på ritningar.

AFD 122 Syn före påbörjande av arbete

AFD.13 Förutsättningar

Det åvilar anbudsgivaren att före avgivandet av anbud noggrant förvissa sig om arbetsområdets belägenhet och utseende, arbetsförhållanden, framkomst möjligheter och utförande hos befintliga byggnadsdelar och anläggningar mm så att denne är fullt förtrogen med de faktorer, förhållanden och omständigheter som kan inverka på entreprenaden.

Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för arbeten föranledda av förhållanden som han genom sådan noggrann förundersökning kunnat skaffa sig kännedom om.

Med ändring av ABT 06 kap 1 § 6 äger entreprenören efter anbudets avgivande icke rätt att erhålla ersättning för sådant som entreprenören förbisett på grund av brist i hans fackmässiga undersökning av fastighet eller del av fastighet som berörs av kontraktsarbetena, eller på grund av utelämnade av sådana förhållanden som framgår av ABT 06 kap 1 § 6 tredje stycket.

Plan för disponering av arbetsområdet skall upprättas av entreprenören och fortlöpande hållas aktuell. Disponering skall ske i samråd med beställaren. Entreprenören skall tillse att inga tillfarter, parkeringsplatser till närliggande fastigheter blockeras.

God ordning skall råda på arbetsplatsen, innebärande att material och hjälpmedel förvaras på anvisade platser och att städning regelbundet sker.

AFD.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

Beställaren förbehåller sig rätten till att under entreprenadtiden utföra sidoentreprenader. Kända sidoentreprenader i dagsläget är:
- Installation och byte av hiss, trapphuset för Pinnmovägen 2.
Hissbytet är beställt av Gavlegårdarnas ramavtalsentreprenör för hiss och utförs under perioden maj-juni i samråd med

ombyggnationen. Totalentreprenören förväntas ha arbetsmiljösamordningen för hissentreprenören och detta ska ingå i anbudet.

- Installation av maskiner i tvättstuga (tvättmaskin, torktumlare och torkskåp) sker med leverans och montering av Gavlegårdarnas ramavtalsentreprenör i samråd med byggentreprenad i slutskedet av byggprojektet.

AFD.132 Arbetstider

Arbete med ljudalstrande redskap får ej ske före kl 08.00 och efter kl 17.00. Kommer arbeten att ske utanför dessa tider måste godkännande ske av beställaren.

Arbeten får inte pågå under tiden 2014-12-22 t.o.m. 2015-01-06. Naturvårdsverkets riktvärden i publikation 2004:15. "Buller från arbetsplatser" ska klaras.

AFD.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Renoveringen utförs med kvarboende och hänsyn till dem ska tas. All arbete som ska utföras inne i lägenheter ska planeras noga så att störningsmomenten för boenden minimeras. Framkomlighet inne i lägenheten kan vara begränsad för vissa arbetsmoment.

Entreprenören ska i god tid informera boende, projektledare och ombyggnadssamordnare om de planerade arbetsmomentens tidplan i lägenheten.

AFD.1331 Förutsättningar med hänsyn till kvarboende och lokalnyttjare

För att genomföra alla planerade åtgärder enligt förfrågningshandlingar måste beställaren, enligt Hyreslagen (Jordabalk (1970:994) 12.kap 18d §), få godkännande av alla hyresgäster som påverkas av ombyggnaden. Insamling av godkännande genomförs av beställaren. Igångsättningstiden för entreprenaden är beroende av att alla hyresgästgodkännande har inkommit till beställaren och tidplan för entreprenade kan komma att förskjutas.

AFD.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader

Entreprenören svarar för erforderligt skydd under entreprenadtiden.

AFD.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m.

AFD.15 Varor m m

I första hand skall returemballage användas. Om returemballage inte kan användas skall emballaget vara väl anpassat till byggplatsens källsorteringssystem.

Material som ej skall förbli beställarens egendom, blir entreprenörens egendom och bortforslas till av denne anskaffad och bekostad återvinningsanläggning.

AFD.151 Varor från entreprenören

- AFD.152 Varor eller arbeten från beställaren**
- AFD.157 Utbildning och support**
TE ansvarar för att utbilda AB Gavlegårdarnas personal på den nya byggnaden och dess nya installationer. Detta beräknas ske vid ett tillfälle med en beräknad tidsåtgång av två timmar.
- AFD.16 Tillstånd m.m.**
Entreprenören äger inte rätt att i annons eller eljest i reklamsyfte publicera det med entreprenaden avsedda objektet utan samtycke från beställaren. Entreprenören ansvarar för att regeln iakttages även av hans underentreprenörer och materialleverantörer.
- AFD.161 Tillstånd från myndigheter**
Med ändring av ABT 06 kap 1 § 11, skall entreprenören ombesörja och bekosta alla tillstånd för entreprenadens genomförande. Undantaget är bygglovsavgift samt anslutningsavgifter som bekostas av beställaren
- AFD.162 Myndighetsbesiktning**
Se ABT 06 kap 1 § 11.
- AFD.17 Anmälningar**
- AFD.171 Anmälningar till myndigheter**
Entreprenören skall ombesörja och bekosta alla erforderliga anmälningar till myndigheter för entreprenadens genomförande.

Beställaren ansöker om bygglov och bekostar detta.
- AFD.18 Författningar**
- AFD. 181 Tillsyn och kontroll enligt PBL**
Entreprenör ska medverka vid de besiktningar, möten med mera som verkställs med stöd av plan- och bygglagen, PBL
- AFD.1811 Kontrollplan enligt PBL**
Entreprenör ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Totalentreprenören ska med kontrollansvarige delta vid samråd med kommunen, samt se till att de handlingar som krävs för att få startbesked och slutbesked tas fram.
- AFD.183 Ansvar för byggarbetsmiljö**
- AFD.1831 Arbetsmiljöplan**
Arbetsmiljöplan ska vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras. Den som är byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering svarar för att arbetsmiljöplan upprättas, och den som är byggarbetsmiljösamordnare för utförande svarar för att arbetsmiljöplanen anpassas med hänsyn till hur arbetet fortskrider

och till eventuella förändringar. Arbetsmiljöplan behandlas i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3, Bygg och Anläggningsarbete.

AFD.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 § 7a samt i anslutande föreskrifter. BAS-P skall uppfylla ställda krav, enligt AFS 1999:3 §6, på utbildning, kompetens och erfarenhet lämplig för detta objekt. Byggherren kommer att kräva in dokumentation som intygar ovan ställda krav.

AFD.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7 b och 7f samt i anslutande föreskrifter. BAS-U skall uppfylla ställda krav, enligt AFS 1999:3 §6, på utbildning, kompetens och erfarenhet lämplig för detta objekt. Byggherren kommer att kräva in dokumentation som intygar ovan ställda krav.

Arbetsmiljöplan

I uppdraget att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande ingår att

1. upprätta arbetsmiljöplan enligt arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och se till att den finns tillgänglig inom arbetsplatsen,
2. utarbeta en till projektets art anpassad dokumentation som skall beaktas vid efterföljande arbeten och
3. se till att alla sådana anpassningar genomförs i arbetsmiljöplanen och dokumentationen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till eventuella förändringar som ägt rum.

Gemensamt arbetsställe

Byggarbetsmiljösamordnaren ska i syfte att åstadkomma tillfredställande skyddsförhållanden vid byggnads- eller anläggningsarbete på gemensamt arbetsställe lämna anvisningar till den som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället.

Byggarbetsmiljösamordnaren ska i syfte att åstadkomma tillfredställande skyddsförhållanden på gemensamt arbetsställe delta i samråd som initieras av den som enligt arbetsmiljölagen kap 3 § 7 d råder över det gemensamma arbetsstället.

AFD.1834 Upplysning om byggarbetsmiljösamordnare

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering är AB Gavlegårdarna. Handläggare Emil Ivarsson. Efter påskrivet



kontrakt med totalentreprenören övertas BAS-P ansvaret av entreprenören utsedd person.

Byggarbetsmiljösamordnare för utförande utses av totalentreprenören.

AFD.185 CE-märkning av sammansatta maskinanläggningar
Entreprenören skall svara för CE-märkning av maskinanläggning i enlighet med AFS 2008:3.

AFD.1851 CE-märkning av hiss, maskinanläggning och tryckbärande anordning
Respektive entreprenör ska vidta de åtgärder som enligt EG:s hissdirektiv, maskindirektiv och direktiv om tryckbärande anläggningar ankommer på tillverkaren. CE-märkning ska vara utförd och försäkras om överensstämmelse ska föreligga vid slutbesiktning, eller om så avtalats, efter avslutad provdrift eller tidigare ibruktagande.

AFD.2 Utförande

AFD.21 Kvalitetsangivelser
Där ej annat anges avses utförande enl. AMA AF 21 i tillämpliga delar och senaste utgåvan av AMA-NYTT.

Entreprenören får inte utan skriftligt godkännande göra utbyte till annat utförande eller annan vara än vad som anges i förfrågningsunderlaget. Eventuellt byte av föreskrivet fabrikat under entreprenadtiden skall skriftligen godkännas av beställaren. Detta gäller även i de fall skrivelsen ”eller likvärdig” finns. Beställaren skall, i god tid, underrättas i varje enskilt fall där entreprenören önskar utbyta föreskriven vara mot likvärdig. Entreprenören ska tillhandahålla erforderliga underlag för prövning av likvärdigheten.

Eventuella merkostnader som drabbar beställaren pga. bytet ersätts av entreprenören.

AFD.22 Kvalitets- och miljöarbete
Anbudsgivare skall bifoga intyg på ISO-certifiering av kvalitets och miljöledningssystem. I de fall anbudsgivare inte är ISO-certifierad skall kvalitets och miljösystem bifogas anbudet.

AFD.221 Kvalitetsledning
Anbudsgivare skall överföra kraven på kvalitetsstyrning till projektörer, underentreprenörer och leverantörer, lämnas efter anmodan till beställaren.

AFD.222 Miljöledning

Anbudsgivare skall överföra kraven på miljöstyrning till projektörer, underentreprenörer och leverantörer, lämnas efter anmodan till beställaren.

AFD.223 Beställarens kvalitets- och miljöplan

Till förfrågan bifogas beställarens kvalitetspolicy och miljöpolicy.

AFD.224 Entreprenörens kvalitetsplan och miljöplan

Se ABT 06 kap 2 § 2

Entreprenören skall redovisa projektanpassad kvalitetsplan och miljöplan, lämnas efter anmodan till beställaren.

AFD.23 Ändringar och tilläggsarbeten

För tilläggs- och ändringsarbeten enligt ABT 06 kap 2 § 4 skall beställaren skriftligen beställa arbetet före utförandet. Om detta ej sker är entreprenören ej berättigad till ersättning. Se även AFD 611.

Med ändring av 2 kap. 3 § och 6 kap. 2 § ABT 06, så är entreprenören endast berättigad att utföra ÄTA-arbeten eller att erhålla ersättning enligt 6 kap. 2 § då det är fråga om ÄTA-arbetena av sådant slag och sådan omfattning att dessa får utföras utan att det måste genomföras en ny annonserad upphandling enligt LOU.

AFD.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

Under entreprenadtiden tillhandahåller beställaren under AFB.22 angivna ritningar och beskrivningar samt av eventuella ändringar av dessa handlingar i digital format.

Totalentreprenören skall i god tid meddela beställaren när uppgifter från beställaren erfordras för entreprenadens genomförande. Dessa uppgifter skall tidsanges i tidplanen enligt AFD.41.

AFD.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Entreprenören skall bekosta och sköta administration, ritningar och protokoll i projektet i, av Beställaren vald projektplattform. Beställaren står för eventuella licenskostnaden.

Entreprenören ansvarar för alla nycklar som entreprenören kvitterat ut från AB GAVLEGÅRDARNA och förbinder sig att svara för alla kostnader som kan uppstå genom att nycklarna kommit i orätta händer. I de fall en underentreprenör behöver nycklar skall Totalentreprenören kvittera ut nycklar åt denne.

Entreprenören skall tillhandahålla följande handlingar senast 2 veckor (arbetsmiljöplan före etableringens påbörjande) efter beställningen:



Försäkringsbesked, se AFD.54
Säkerhet enligt AFD.631
Betalningsplan enligt AFD.622
Dispositionsplan enligt AFD.13
Tidplan, se AFD.41.

Erforderliga handlingar för entreprenadens genomförande. Dessa handlingar skall tillsändas beställaren för granskning och godkännande innan arbetena får påbörjas. Beställarens granskningstid skall vara 10 arbetsdagar.

Beställarens kontroller etc. fritar inte anbudsgivare från ansvar enligt ABT 06.

Arbetsmiljöplan enligt AFS 2008:16 skall innan etablering överlämnas till beställaren för påseende och därefter anslås på arbetsplatsen. Entreprenören skall göra förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket.

Kopia på förhandsanmälan ska skickas till beställaren.

Handlingar enligt ovan skall granskas gemensamt av parterna och slutgiltigt revideras av entreprenören för beställarens godkännande.

Beställaren äger fritt förfoga över lämnade ritningar och handlingar inom ramen för AB Gavlegårdarnas verksamhet.

Ansökningshandlingar

Entreprenören ombesörjer och bekostar de ansökningar och anmälningar som kan förekomma. Kopia av ansökningshandlingarna delges beställaren.

Handlingar för granskning

Handlingar för granskning enligt ABT 06 delges beställaren som filer i pdf-format genom uppladdning av dessa på Beställarens valda projektplattform. Ritningar skall vara märkta "Granskningsritning".

Bygghandlingar

Handling som granskats och godkänts och enligt vilken entreprenören bygger stämplas "bygghandling" av entreprenören och delges beställaren digitalt som pdf och även upprättas i dwg-format. Endast handlingar märkta "BYGGHANDLING" skall ligga till grund för entreprenadens utförande.

Relationshandlingar

Entreprenören skall två veckor innan slutbesiktning överlämna preliminära relationshandlingar för granskning.

Senast vid slutbesiktningen skall entreprenören till beställaren överlämna följande handlingar och underlag:

- På, av Beställaren vald projektplattform, skall följande laddas upp av TE:
 - dwg-filer för arkivering samt med skalriktiga PDF-filer och calx-filer. Samtliga filer ska innehålla linjal.

Om entreprenören inte överlämnat uppräknade handlingar och underlag till beställaren utgör det hinder för att godkänna entreprenaden.

Instruktion för drift och underhåll

Entreprenören skall två veckor innan slutbesiktningen överlämna preliminära drift- och underhållsinstruktioner för granskning.

Senast vid slutbesiktningen skall entreprenören till beställaren överlämna två omgångar drifts- och underhållsinstruktioner.

Drifts- och underhållsinstruktionerna i PDF-format skall av entreprenören läggas in på, av Beställaren vald projektplattform, enligt beställarens struktur.

Om entreprenören inte överlämnat uppräknade handlingar och underlag till beställaren utgör det hinder för att godkänna entreprenaden

Redovisning av entreprenörens mängdförteckning

Entreprenören skall, vid slutbesiktning, överlämna mängdförteckning på ingående material och komponenter som beställaren kan använda som underlag för sin underhållsplanering. Beställaren tillhandahåller information/lista kring hur mängderna skall redovisas. Mängderna skall ej vara prissatta.

AFD.2423 Nyttjande av handlingar m.m.

Med ändring av ABT 06 kap. 1 13-14 §§ gäller att beställaren skall ha rätt att fritt förfoga över av entreprenören överlämnade ritningar inom ramen för AB Gavlegårdarnas verksamhet.

AFD.25 Beställarens krav på sekretess

Entreprenören ska känna till och ta hänsyn till beställarens sätt att hantera personuppgifter såsom beskrivet i Gavlegårdarnas Integritets och personuppgiftspolicy. Policyn fås på begäran.

Om Leverantören i sin tjänsteutövning får vetskap om missförhållande i lägenheter ska denne informera berörd beställares kontaktperson. Leverantören får inte avslöja missförhållande till utomstående. Personuppgifter skall behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning, GDPR.

Leverantören omfattas av absolut tystnadsplikt avseende de uppgifter och information som kommer Leverantören till del i samband med uppdraget. Leverantören skall även tillse att egen personal och/eller av Beställaren godkända underleverantörer omfattas av denna tystnadsplikt. Med sekretess avses förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (tystnadsplikt), genom

att en handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Bestämmelser om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i det allmänna verksamhet regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Enligt 2 kap.1 § i Offentlighets- och sekretesslag gäller lagen även för person som på uppdrag av myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet. Ålägganden enligt denna paragraf gäller även efter det att entreprenaden avslutats.

AFD.26 Information

AFD.262 Beställarens informationsverksamhet

AFD.263 Information till fastighetsägare, boende m fl.

Entreprenören ska utan extra kostnad medverka vid informations möten, budning och skyltning av området.

Entreprenören är skyldig att informera omkringliggande boende vid särskilda störningsmoment. Skriftlig information ska ske min 3 dagar och med en helg i mellan innan arbete utförs.

AFD.27 Underrättelse om avvikelser o d

Underrättelse enligt ABT 06 kap 2 § 10 skall lämnas skriftligen. Notering om avvikelse i dagbok räknas inte som avvikelse.

AFD.28 Entreprenörens kontroll

Entreprenören skall senast 10 dagar innan provning utförs underrätta beställaren om tidpunkt för sådan provning på arbetsplatsen som anges i entreprenadhandlingarna. Föreskriven provning skall dokumenteras. Intyg och protokoll över föreskriven provning eller mätning skall lämnas till beställaren snarast efter provningen eller mätningen. Föreskrifter om provning anges i tekniska beskrivningar.

Funktionsprovning och driftsättning samt täthetsproven skall vara klara minst 2 veckor innan slutbesiktning.

AFD.3 Organisation

AFD.31 Beställarens organisation

AFD.311 Beställarens ombud

Beställarens ombud under entreprenadtiden är:

Mattias Janson
AB GAVLEGÅRDARNA
Box 456
801 06 Gävle
Tel 026-17 27 73

- AFD.312 Beställarens projektledare m fl.**
Se AFA.121
- AFD.313 Beställarens kontrollant**
Beställarens kontrollant för objektet är Emil Ivarsson.
- AFD.314 Beställarens kvalitetsansvarige**
Beställarens kvalitetsansvarige för objektet är Emil Ivarsson.
- AFD.315 Beställarens miljöansvarige**
Beställarens miljöansvarige för objektet är Mats Åström.
- AFD.316 Beställarens informationsansvarige**
Beställarens informationsansvarige för objektet är Emil Ivarsson.
- AFD.318 Beställarens övriga befattningshavare**
Beställarens ombyggnadssamordnare för objektet är Susanne Zettergren.
- AFD.32 Entreprenörens organisation**
Entreprenören ska, beträffande den personal som är engagerad för utförande av uppdraget, tillse att löne- och anställningsvillkor enligt, eller jämförbara med, kollektivavtal som gäller för den bransch som uppdraget avser, tillämpas.
- AFD.321 Entreprenörens ombud**
Skall namnges i anbudet.
- AFD.322 Entreprenörens projekteringsledare**
Se AFD.326
- AFD.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl.**
Skall namnges i anbudet.
- AFD.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige**
Namnges efter anmodan.
- AFD.325 Entreprenörens miljöansvarige**
Namnges efter anmodan.
- AFD.33 Möten**
- AFD.331 Startmöte**
Startmöte ska hållas innan entreprenaden påbörjas. Mötet kommer att ske på AB Gavlegårdarnas huvudkontor, Utanvindsvägen 1. Beställaren kallar till mötet.
- AFD.332 Projekteringsmöten**
Beställaren eller dennes ombud skall beredas tillfälle att delta i entreprenörens projekteringsmöten. Dessa möten ska vara

protokollförda. Varje part svarar för sina kostnader för deltagande i projekteringsmöten.

AFD.333 Byggmöten

Entreprenören och underentreprenörernas representanter är skyldiga att utan extra kostnad för beställaren delta i byggmötena.

Byggmöten hålls med jämna mellanrum vilket bestäms i samråd mellan entreprenör och beställaren. Vid byggmöten förs protokoll genom beställarens försorg, vilket justeras vid nästa möte.

AFD.34 Projekteringsledning, arbetsledning och anställda

Entreprenören ska redovisa referenser för föreslagen arbetsledning (platschef/ produktionschef). Entreprenören äger inte utan beställarens skriftliga medgivande byta ut i anbudet namngiven platschef/ produktionschef.

En platschef som kvalificerats enligt AFB.52 pkt 7 kan helt eller delvis bytas ut mot en platschef som inte själv uppfyller kraven i den punkten *endast* om entreprenören i sitt anbud visat hur den kvalificerade platschefen kommer att stötta och övervaka den andra platschefen i viktiga arbetsmoment så att motsvarande kvalitet säkerställs på ett för beställaren fullgott sätt. Beställare äger ensamrätt att besluta om krav enligt ovanstående uppfylls. CV skall bifogas anbud på den platschef/produktionschef (den oerfarne) som behöver stöttning.

Samtliga personer från entreprenör eller som anlitats av entreprenör och befinner sig på arbetsplatsen skall vara väl bekant med innehållet i AB Gavlegårdarnas Entreprenörshandboken.

AFD.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

För entreprenaden gäller ID06.

AFD.345 Elektronisk personalliggare

Entreprenören skall överta samtliga skyldigheter som beställaren har med avseende på elektronisk personalliggare enligt 39 kap 11 b§ och 12§ samt 7 kap 2a§ och 4§ Skatteförfarandelagen.

Entreprenören gör Anmälan – Byggarbetsplats till Skatteverket. Detta skall göras före etablering av arbetsplatsen.

Entreprenören skall, i samband med inskickad anmälan, skicka kopia till beställaren på Anmälan – Byggarbetsplats, i form av Skatteverkets blankett SKV 1528.

Efter avslutad entreprenad skall entreprenören göra Avanmälan – Byggarbetsplats till Skatteverket.

Entreprenören skall i samband med inskickad avanmälan, skicka kopia till beställaren. Entreprenören skall därefter på anmodan, i två år efter avanmälan av byggarbetsplatsen, kunna visa lista på samtliga personer som varit verksamma på byggarbetsplatsen.

Listan skall uppfylla Skatteverkets krav på personalliggare.

AFD.35 Underentreprenörer

Underentreprenörer som entreprenören behöver anlita för utförande av sin entreprenad skall vara godkända av beställaren. Detta gäller även ytterligare underentreprenörer, d.v.s. underentreprenör i sin tur behöver anlita underentreprenör. Anlitade underentreprenörer skall av entreprenören vara kontrollerade avseende AFB.52 pkt 1- 2.

Entreprenören garanterar att endast företag som fullgjort sina skyldigheter mot stat och kommun anlitas som leverantörer och underentreprenörer avvaror och tjänster för denna entreprenad. Avtal med underentreprenörer, vars arbeten omfattas av något av kollektivavtalen Byggnads-, Väg-, och Banavtalet, tecknas med UE 2021 som avtalsinnehåll.

Beställaren kan komma att begära uppgifter från Skatteverket avseende de företag som huvudentreprenören anlitar. Uppgifter som kan komma att begäras avseende registrering och betalning för mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, innehav av F-skattsedel samt information om eventuellaskatteskulder. Upplysningarna kan komma att inhämtas i samband med upphandlingen och löpande under byggnationens gång.

Ovanstående gäller för alla led av underentreprenörer.

Entreprenören ska vid var tid ha en uppdaterad förteckning som utvisar komplett underentreprenörsorganisation i samtliga led innehållande följande uppgifter:

- Organisationsnummer
- Om företaget har F-skattsedel
- Om företaget redovisar moms och skatt i Sverige
- Om företaget har någon otvistig förfallen fordran från arbetstagare på lön eller ersättning
- Om företaget har kollektivavtal
- Att företagets personal är försäkrad
- Att anställd personal har erforderlig kompetens för sitt arbete
- Att företaget följer lagar och regler som gäller för arbetet

Förteckning enligt ovan redovisas i samband med byggmöten samt inom 1 vecka vid beställarens begäran.

AFD.36 Beställarens kontroll

Beställaren kommer att upprätta en egen kontrollorganisation. Någon ersättning för handräckning för beställarens kontroll skall inte utgå.

Beställaren skall om denne så önskar ha rätt att utöva kontroll av tillverkning av material som skall användas i objektet. Sådan kontroll kan även utövas på tillverkningsstället.

AFD.37 Samordning

AFD.371 Samordning av arbeten

Med ändring av ABT 06 kap 3 § 9 ska TE svara för att hans egna arbeten samordnas med beställarens samt sidoentreprenörers och andras arbeten som redovisas under AFD.131.

AFD.38 Dagbok

Endast en dagbok skall föras gentemot beställaren.
Entreprenören redovisar dagboken för beställaren i samband med varje byggmöte om beställaren så önskar.

AFD.39 Uppmätning

AFD.4 Tider

AFD.41 Tidplan

Arbeten får inte pågå under tiden 2025-07-07 t.o.m. 2025-07-20 om inte beställaren tillåter detta.
Tidplan kan komma att förskjutas om beställaren inte får startbesked på bygganmälan innan igångsättningstiden.

AFD.42 Igångsättningstid

Entreprenaden beräknas kunna påbörjas 2025-03-24.
Igångsättningstiden för entreprenaden är beroende av igångsättningstillstånd från styrelse samt startbesked från bygglov har inkommit till beställaren.

AFD.45 Färdigställandetider

Entreprenaden skall i sin helhet vara klar för slutbesiktning senast 2025-08-15.

AFD.46 Förändring av kontraktstid

Med ändring av ABT 06 kap. 4 § 2 föreskrivs att ändrings- och tilläggsarbete enligt ABT 06 kap 2 § 3 och 4 intill 10 % av kontraktssumman, normalt fördelade under kontraktstiden, inte skall medföra jämkning av färdigställandetiden.

AFD.47 Garantitid

AFD.471 Garantitid för entreprenaden

Garantitiden är 5 år när det gäller material, varor och arbete.
Med ändring av ABT06 kap.4 §7 gäller fem års garantitid även för material föreskrivet av beställaren.

AFD.472 Särskild varugaranti

Garantiutfästelser om särskilda materialgarantier, enligt föreskrifter i respektive teknisk beskrivning och övriga garantier som entreprenören utverkar, skall vara utställda på beställaren och

överlämnas i samband med slutbesiktningen. Garantitiden skall räknas från entreprenadens godkännande.
Särskild garantiutfästelse inskränker inte entreprenörens eget ansvar.

AFD.5 Ansvar och avhjälpande

Med ändring av ABT 06 kap 5 § 6 föreskrivs:

Entreprenören ansvarar för fel, som framträder efter garantitidens utgång, om felet visas ha grund i vårdslöshet av entreprenören.

Entreprenören ansvarar dock inte för fel efter garantitiden om kostnaden jämte kostnad som avses i kap 5 § 8 understiger 0,5 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

Samma slags fel på flera ställen på entreprenaden anses som ett fel vid bedömningen av entreprenörens ansvar enligt detta stycke.

För i denna paragraf angivet ansvar gäller i lag föreskriven allmän preskriptionstid från garantitidens början.

AFD.51 Vite

AFD.511 Vite vid försening

Vid försening är beställaren berättigad att av entreprenören erhålla vite med ett belopp av 0,5 % av kontraktssumman för varje påbörjad vecka varmed kontraktsarbeten i deras helhet blivit fördröjda enligt entreprenörens upprättade arbetstidplan, kopplad till färdigställandetid angiven i denna AF.

AFD.518 Övriga viten

För det fall namngiven platschef byts ut utan sådant skriftligt medgivande från beställaren utgår vite med 200 000 kronor.

AFD.53 Ansvar mot tredje man

AFD.531 Syn inom närliggande område

Syn skall förrättas efter samråd med beställaren.

AFD.54 Försäkringar

Entreprenören skall ha allrisk- och ansvarsförsäkring enligt ABT 06 kap 5 § 23. För allriskförsäkringen gäller dessutom att efter avlämnande skall försäkringsskyddet finnas för skador som beror på fel i montageverksamheten. Allriskförsäkringen skall även gälla för arbete som beställaren tillhandahåller.

Entreprenören skall med försäkringsbevis styrka att hans allrisk- och ansvarsförsäkringar uppfyller försäkringsbranschens beskrivning av basomfattning för allriskförsäkring och ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. Beskrivning av minimiomfattning återges i AMA AF 21. Försäkringsbeviset skall vara utformat enligt exempel i AMA AF 21. Entreprenören skall därpå årligen redovisa att försäkringarna vidmakthålls, i annat fall

äger beställaren rätt att teckna försäkring på entreprenörens bekostnad.

AFD.55 Ansvar för brandskydd

Vid heta arbeten gäller Brandskyddsföreningens säkerhetsregler för heta arbeten.

Totalentreprenör utses till samordningsansvarig.

Den personal hos entreprenören, underentreprenörer och leverantörer som skall ansvara för brandskyddet, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha behörighetsutbildning och erfarenhet av brandskydd. Utbildningen skall vara genomförd enligt den plan som beslutas av försäkringsbolagen och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för heta arbeten.

AFD.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

Entreprenören skall tillhandahålla en namngiven fysisk person som skall ansvara för brandskyddet i samband med entreprenaden.

Till brandskyddsansvarig person får inte utses den som skall utföra brandfarliga heta arbeten.

AFD.57 Avhjälpande

Med ändring av 5 kap. 17 § andra stycket i ABT 06, skall avhjälpande fullgöras utan dröjsmål och senast inom två (2) veckor från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillsänds entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Har inte entreprenören avhjälpt felet inom två (2) veckor eller meddelat beställaren skriftligen om förlängning för att avhjälpa felet, så har beställaren rätt att avhjälpa felet på entreprenörens bekostnad.”

Felanmälningar som inkommer under garantitiden ska hanteras av entreprenören i Gavlegårdarnas entreprenörswebb.

AFD.58 Ansvar efter garantitiden

AFD.6 Ekonomi

AFD.61 Ersättning

AFD.611 Ersättning för ändringar och tilläggsarbeten

Med ändring av 6 kap. 6 § ABT 06 ska värdet av ÄTA-arbete alltid beräknas utifrån avtalad debiteringsnorm i anbudsformulär, oberoende av eventuella ändringar av mängden arbeten och/eller ändrade förutsättningar för arbetet.

Med ändring av 6 kap. 9 § ABT 06 ska ersättning enligt självkostnadsprincipen vid löpande räkning utgå enligt följande.

- För kostnader enligt punkt 1, avseende material och varor som Totalentreprenören tillhandahåller, utgår ersättning med

verifierad självkostnad och därutöver ett procentuellt påslag enligt anbudsformulär, omfattande punkterna 2, 4 och 6-8.

- För kostnader enligt punkt 3, avseende arbetare som Totalentreprenören tillhandahåller (exklusive underentreprenörers arbetare), utgår ersättning per timme enligt anbudsformulär. Timersättningen omfattar ersättning för punkterna 2-4 och 6-8.
- För kostnader enligt punkt 5, avseende underentreprenader, utgår ersättning med verifierad självkostnad och därutöver ett procentuellt påslag enligt anbudsformulär, omfattande punkterna 2, 4 och 6-8.

Ersättningen är en fast ersättning utan indexreglering. Någon ersättning för ÄTA-arbete utöver ovan utgår inte.

Timpriser och å priser vid ÄTA enligt anbudsformulär.

AFD.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)
Kontraktssumman skall inte indexregleras.

AFD.615 Slutavräkning

AFD.62 Betalning
Betalning sker mot faktura en gång per månad efter utfört arbete. I fakturan innehållet belopp skall redovisas. Betalning av godkänd faktura sker inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan. Faktura som tas emot av beställaren under eller inom två veckor före ordinarie semester betalas inom en månad efter första arbetsdag efter byggsemestern.

AFD.622 Betalningsplan
Kontraktssumman erläggs enligt prestationsbunden och tidsbunden betalningsplan, vilket tio dagar efter anmodan skall överlämnas till beställaren.

Betalningsplanen skall upprättas enligt de grunder som anges i ABT 06 kap 6 § 12, 15 och 16.

Ett belopp motsvarande minst 5 % av kontraktssumman skall dock innestå till dess att samtliga fel enligt besiktningsutlåtande och fel som beställaren påtalat enligt ABT 06 kap 7 § 11 blivit avhjälpt.

AFD.623 Förskott
Förskott beviljas ej.

AFD.624 Fakturering
Fakturering sker genom elektroniska fakturor enligt lag 2018:1277. Samtliga fakturor märks med projektnummer, namn och referensnummer. Faktura skickas en gång/månad.

Faktureringsplan sker enligt betalningsplan som överenskommes mellan parterna. Entreprenören tillhandahåller förslag till betalningsplan enligt AFD.622.

Faktura skall innehålla uppgift om:

1. kontraktssummans storlek
2. tidigare fakturerade lyftningsbelopp
3. aktuellt lyftningsbelopp
4. resterande belopp av kontraktssumman att fakturera

Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten skall faktureras separat och ges särskilda nummer för identifiering.

AFD.625 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntesats enligt lag, f.n. 8 procentenheter över gällande referensränta.

AFD.63 Säkerhet

AFD.631 Säkerhet till beställaren

Entreprenören skall ställa säkerhet enligt ABT 06 kap 6 § 21. Säkerhet skall utgöras av bankgaranti eller likvärdigt.

AFD.7 Besiktning

AFD.71 Entreprenadbesiktningar

AFD.713 Slutbesiktning

Slutbesiktning skall ske av beställaren utsedd besiktningsman och efter entreprenörens anmälan.

Entreprenörens anmälan om slutbesiktning skall ske skriftligen senast en månad före slutbesiktningen.

Med tillägg till ABT 06 får ej besiktningsmannen godkänna entreprenaden förrän:

1. De provningar utförts och tillhörande protokoll överlämnats till beställaren, som skall vara utförda till slutbesiktningen.
2. Entreprenören till beställaren överlämnat relationshandlingar, drifts- och skötselinstruktionerna och annat material som enligt kontraktet skall överlämnas till beställaren senast 2 veckor innan slutbesiktning.
3. Entreprenörens åtaganden enligt kontrollplan PBL, fastställda vid byggsamråd är uppfyllda.

Med tillägg till ABT 06 kap 7 §11 gäller:

Om fel kan hänföras till utförande som genom entreprenörens kvalitetssäkringsdokumentation påstås vara kontraktssenligt, får talan under garantitiden föras beträffande sådana fel, även om dessa ej konstaterats vid den genomförda slutbesiktningen.

AFD.714 Garantibesiktning

En syn skall genomföras två (2) år efter entreprenadens godkännande (tvåårssyn) och skall omfatta hela entreprenaden. Ytterligare en besiktning skall genomföras före utgången av den femåriga garantitiden.

AFD.716 Efterbesiktning

Påkallas efterbesiktning utförs denna av besiktningsman och bekostas av entreprenören.

AFD.718 Besiktningsman

Besiktningsman utses och bekostas av beställaren.

AFD.72 Besiktningssammanträde

AFD.8 Hävande

Med tillägg till 8 kap. 1 § ABT 06 så föreligger skäl för hävning av avtal från beställarens sida även om företrädare för TE/UE blir dömd för olaga diskriminering eller om TE/UE tvingas betala ut skadestånd enligt följande lagstiftning:

- Jämställdhetslagen
- Lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
- Lagen om förbud mot diskriminering av personer med funktionshinder
- Lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning
- Beställaren äger även rätt att med omedelbar verkan häva avtalet om entreprenören inte följer avtalade skyddsföreskrifter/arbetsmiljövillkor/och arbetsmiljölagar.
- Entreprenören efter skriftligtpåpekande inte vidtar erforderliga åtgärder för att uppfylla krav enligt AFD.35.

AFD.9 Tvist

Med ändring av ABT 06 kap 9 § 1 skall tvist avgöras av Gävle Tingsrätt såvida parterna inte kommer överens om annat.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga allmänna arbeten och hjälpmedel för den egna entreprenaden, där inte annat anges i detta avsnitt.

- AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel**
Bodar och upplag skall placeras i samråd med beställaren. Vid placering av bodar eller upplag skall hänsyn tas till allmänna trafikleder (gång- och cykelväg) samt till de omkringliggande fastigheterna.
- AFG.111 Placeringsritning som upprättas av entreprenören**
Entreprenören upprättar underlag för dispositionsritning över bodplacering, upplagsplaner o d samt över allmänna hjälpmedel.
- AFG.12 Bodar**
Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa erforderliga bodar för arbete i entreprenaden.
- AFG.13 Tillfällig väg och plan**
Totalentreprenör samt blivande underentreprenörer får inte utnyttja i anslutning till arbetsområdet befintliga biluppställningsplatser för personal som arbetar i entreprenaden. Parkering i närområdet kan eventuellt få nyttjas i samråd med beställaren.
- AFG.14 Tillfällig el- och va försörjning**
Ordnas och bekostas av entreprenören. Förbrukningskostnader bekostas av entreprenören.
- AFG.3 Skydd mm**
- AFG.31 Skydd av arbete och egendom mm**
- AFG.311 Skydd av arbete**
Arbeten får inte utan betryggande skyddsåtgärder bedrivas under väder som kan orsaka skada. Material och byggnadsdelar som är fuktkänsliga ska väderskyddas.
- Entreprenören ska skydda eget färdigställt arbete om det kan skadas genom förslitning under entreprenadtiden.
- Entreprenören ska proppa eller skydda öppna rörändar, kanaler och dylikt till skydd mot damm, främmande föremål eller skada.
- AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m**
Entreprenören skall skydda befintliga ledningar för vatten, värme och avlopp, el, fjärrvärme, fiber, kabel TV mfl.
- AFG.315 Skydd av egendom**

- AFG.316 Tillfällig inhägnad**
Totalentreprenören skall avgränsa arbetsområde samt etableringsområde på betryggande sätt med inhägnad i form av byggstängsel. Även de schakter som skall utföras utanför arbetsområden skall inhängas av totalentreprenören. Beställaren förbehåller sig rätten till affisivering inom arbetsområdet och på tillfälliga inhägnader.
- AFG.32 Arbetarskyddsanordningar**
Om entreprenören på grund av eget arbete demonterar gemensam skyddsanordning eller del därav ska denne
- rapportera detta till byggarbetsmiljösamordnaren (BAS-U)
 - vid behov se till att tillfällig skyddsanordning monteras
 - återställa skydd omedelbart efter avslutat arbete
- AFG.34 Bullerskydd**
Ansvaret för bullerskydd åligger entreprenören. Ljudnivån på maskiner och arbeten skall med hänsyn till omgivningen hållas inom de gränsvärden som är satta enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (2004:15 Buller från arbetsplatsen).
- AFG.36 Begränsning av miljöförstörande utsläpp**
Ansvaret för arbetsmetoder, drift av maskiner och utrustning med hänsyn till miljöförstörande utsläpp till mark, luft och vatten åligger entreprenören.
Entreprenören skall i sin miljöplan redovisa åtgärder och metoder för att undvika miljöförstörande utsläpp.
Maskiner som används i entreprenaden ska vara lägst miljöklass Euro 5 på lastbilar och Steg 3 på övriga maskiner.
- AFG.5 Arbetsställningar och montering**
- AFG.51 Arbetsställningar**
Lämpliga arbetsställningar och arbetsplattformar för entreprenadens utförande tillhandahålls av entreprenören. Ställningar anordnas med hänsyn till framkomligheten för hyresgäster vid entréer och andra fasaddörrar ex. tvättstugedörren.
- AFG.6 Ursparning, håltagning, igensättning och tätning**
- AFG.61 Ursparning och håltagning**
Håltagning i byggnadsdelar av betong skall utföras med kärnborr eller sågning med tillhörande vattensugning. Håltagning får ej utföras med bilningsverktyg.

**AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten
mm**

AFG.71 Uppvärmning och uttorkning
Totalentreprenören svarar för samtliga kostnader i samband med uppvärmning och uttorkning.

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m m

AFG.82 Renhållning
Entreprenören svarar för renhållning inom arbetsområdet samt även utanför dessa till följd av transporter för entreprenadarbeten.

AFG.83 Städning och slutrengöring

AFG.831 Städning
Entreprenören skall utföra kontinuerlig städning inom arbetsområdet.

AFG.832 Slutrengöring
Slutrengöring omfattar såväl invändig som utvändig rengöring. Fönster ska putsas på både ut- och insida samt emellan fönsterbågar.

AFG.85 Återställande av mark
Gäller alla ytor som påverkats av entreprenaden.
